Section souterraine Tramway de Nice - Travaux de génie civil et équipements liés
PLANNING CONTRACTUEL THAUMASIA
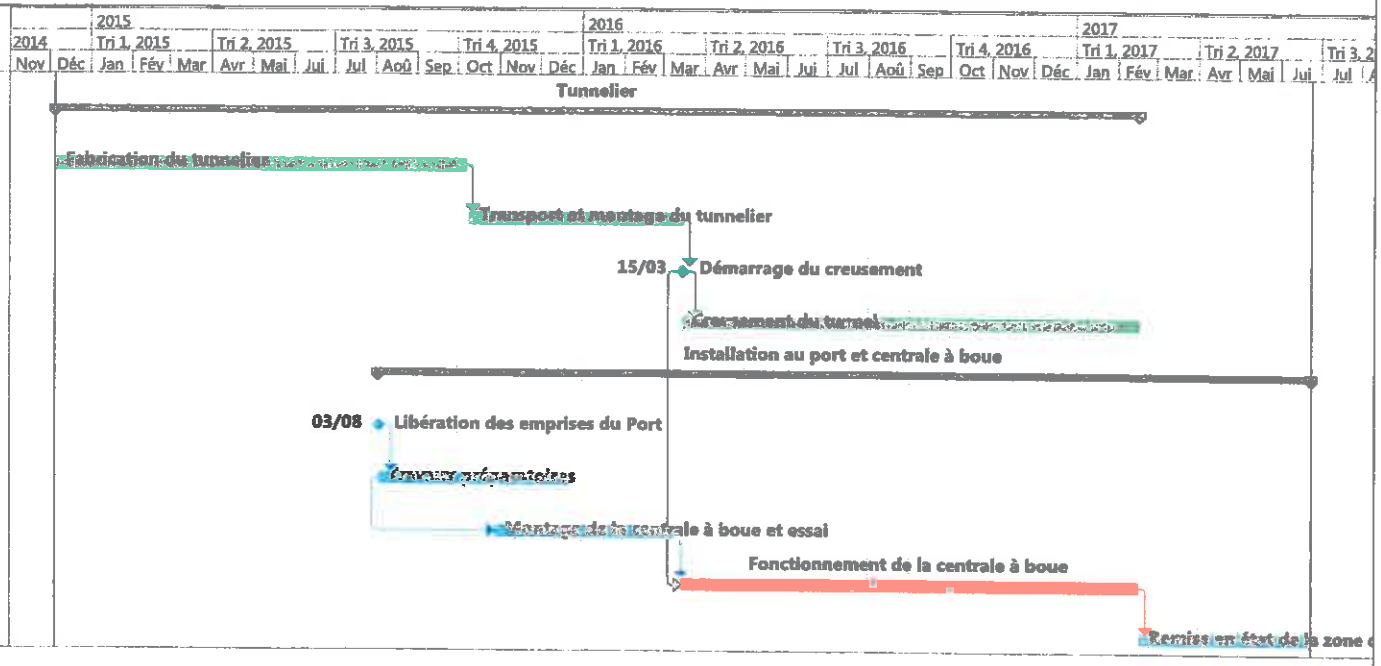
N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	Tunnelier	Ven 05/12/14	Mer 15/02/17
2	Fabrication du tunnelier	Ven 05/12/14	Mar 06/10/15
3	Transport et montage du tunnelier	Ven 09/10/15	Mar 15/03/16
4	Démarrage du creusement	Mar 15/03/16	Mar 15/03/16
5	Creusement du tunnel	Mar 15/03/16	Mer 15/02/17
6	Installation au port et centrale à boue	Lun 03/08/15	Ven 23/06/17
7	Libération des emprises du Port	Lun 03/08/15	Lun 03/08/15
8	Travaux préparatoires	Lun 03/08/15	Lun 21/12/15
9	Montage de la centrale à boue et essai	Mer 28/10/15	Mar 08/03/16
10	Fonctionnement de la centrale à boue	Mar 15/03/16	Mer 15/02/17
11	Remise en état de la zone d'installation du Port	Jeu 16/02/17	Ven 23/06/17
